

MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

MAH-2008

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO ELEVADOR AUTOMOTIVO PANTOGRÁFICO TESOURA 4.2 TONELADAS

CÓDIGO: MAH-2008



ÍNDICE

REQUISITOS DO LOCAL DE TRABALHO	4
DIMENSÕES	5
DIMENSÕES DAS SAPATAS.....	6

CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MAHOVI

NOME DO CLIENTE:		TELEFONE:	
CNPJ:		DATA:	
ENDEREÇO:		NUM. PEDIDO:	

Confirmar abaixo se todas as exigências para a instalação de seu elevador pantográfico foram cumpridas. O não cumprimento dessas exigências impede que a instalação seja realizada.




**ELEVADOR PANTOGRÁFICO TESOURA MAH-2008.
(Requisitos do Local de Trabalho)**

- Pé direito mínimo exigido: 4000mm
- Piso curado, nivelado, regular e resistente 3000 psi (210/cm³)
(Suportar o torque de 160Nm dos parabolts)
- Profundidade mínima do concreto de 150mm.....
- Óleo hidráulico: ISO VG 46 ou 32 - Capacidade 20 Litros.....
- Ponto de energia: 220 ou 380v trifásico 60Hz
com disjuntor tripolar de 20A.
- Ponto de ar comprimido próximo a central do elevador
- Área de instalação demarcada e livre para operação


Eu, _____, CPF/CNPJ _____, Confirmo que todas as exigências citadas acima para a instalação do elevador foram cumpridas e confirmadas com no mínimo **3 dias** de antecedência da data de entrega agendada. O não cumprimento dessas exigências, impede que a instalação seja realizada e que todos os custos operacionais sejam cobrados, assim como o valor da instalação de **R\$2.500**, deslocamento (Base Mahovi - Sorocaba, SP) **R\$2,50** por KM, despesa com hotel, alimentação.

REV. 01 - 02/11/2024

DIMENSÕES

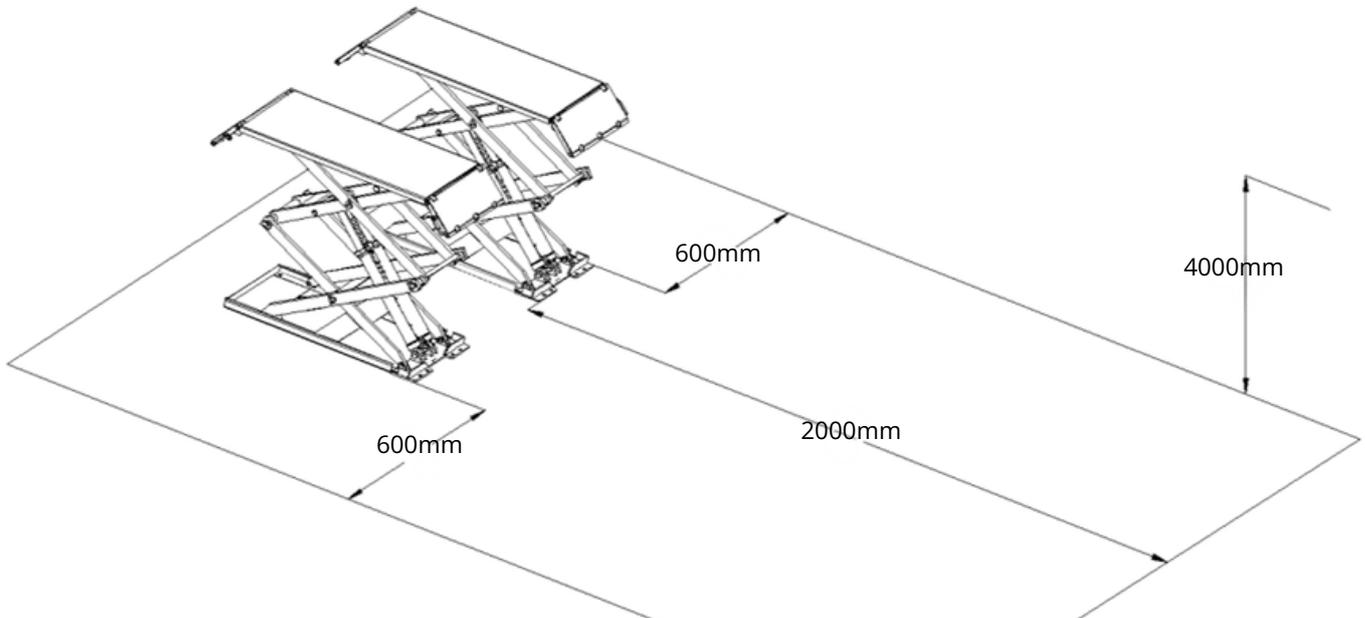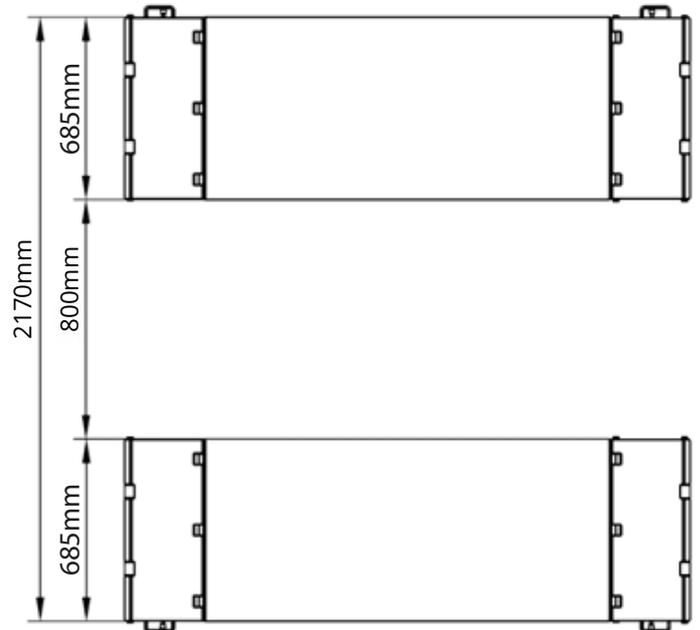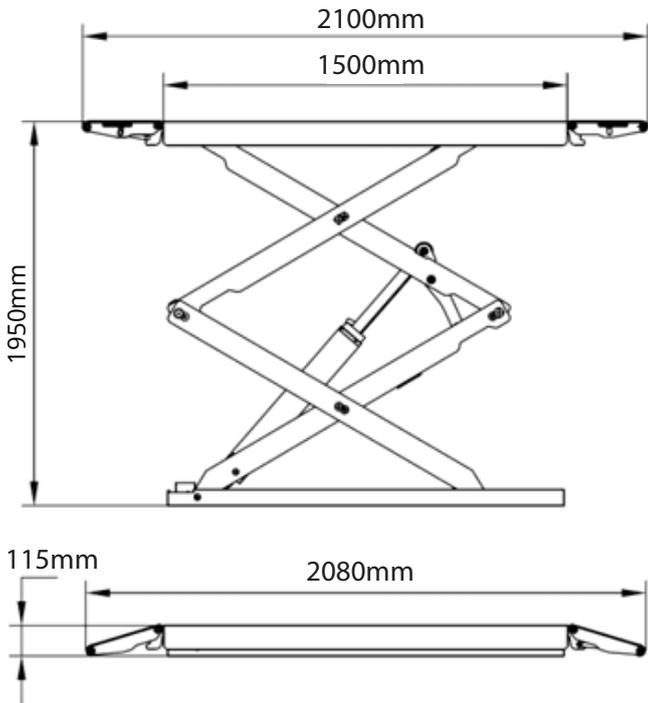

DIMENSÕES DAS SAPATAS

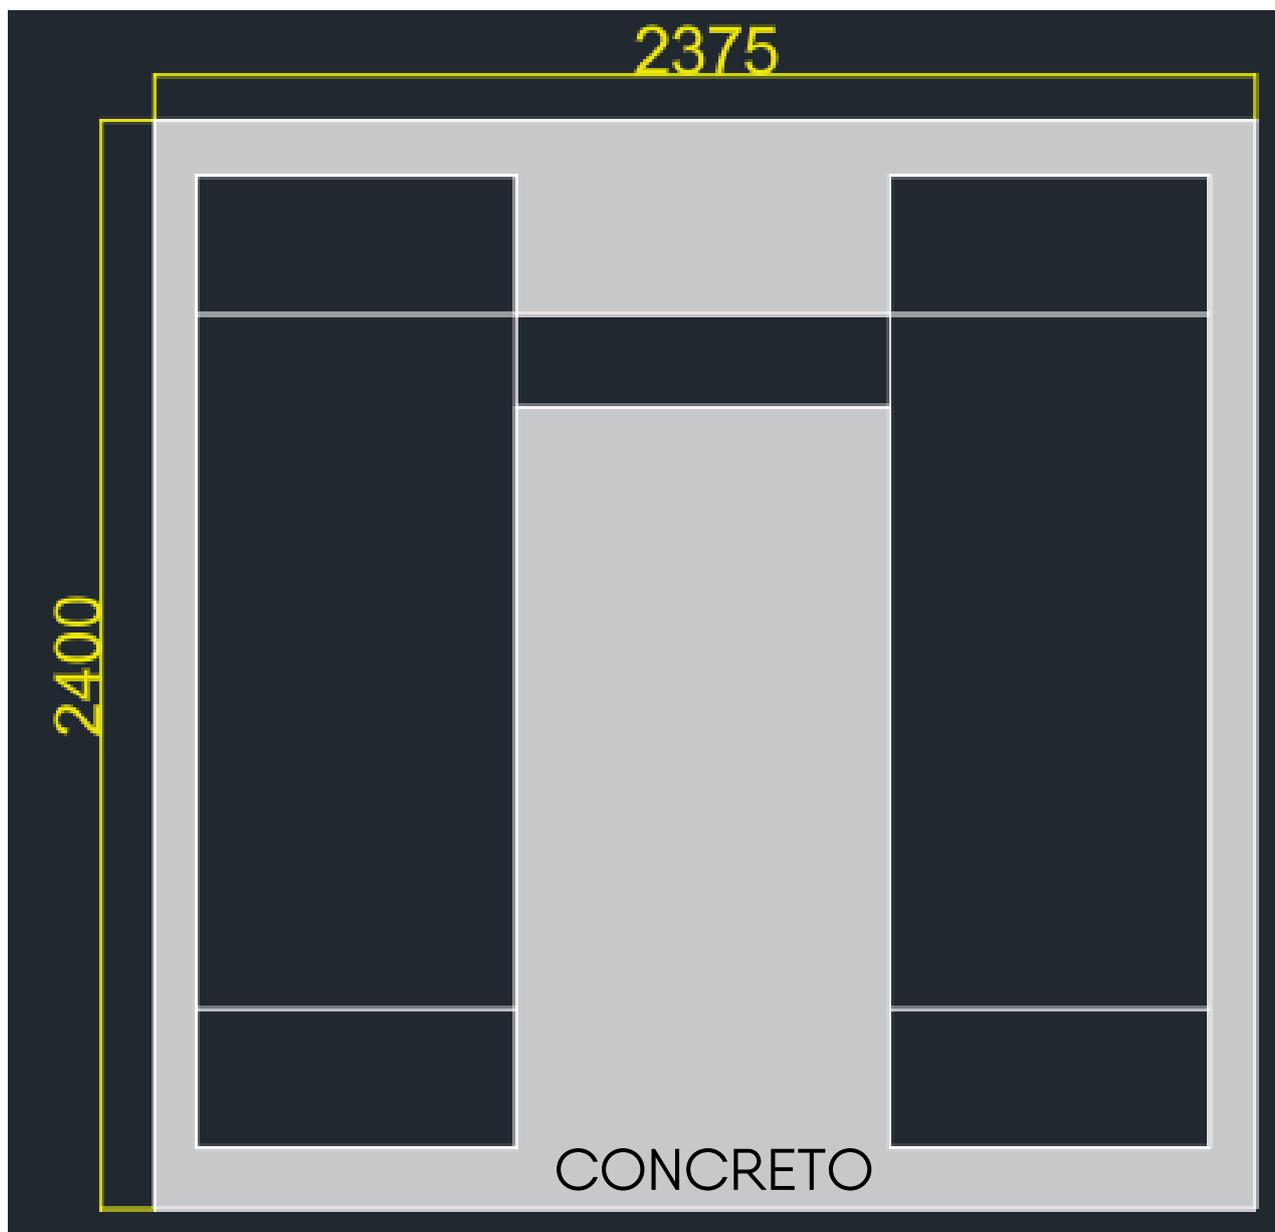

- 150mm de profundidade
- Resistência de 3000 psi/210cm³ para suportar o torque de 160Nm dos parabolts

REV. 01 - 02/11/2024



MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO
MAH-2008

 WWW.MAHOVI.COM.BR

 Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP
