

MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

MAH-2004

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO ELEVADOR AUTOMOTIVO PANTOGRÁFICO MOVÉL

CÓDIGO: MAH-2004



CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MAHOVI

NOME DO CLIENTE:		TELEFONE:	
CNPJ:		DATA:	
ENDEREÇO:		NUM. PEDIDO:	

Confirmar abaixo se todas as exigências para a instalação de seu elevador pantográfico foram cumpridas. O não cumprimento dessas exigências impede que a instalação seja realizada.

**ELEVADOR AUTOMOTIVO PANTOGRÁFICO MOVÉL 3 TONELADAS - MAH-2004.
(Requisitos do Local de Trabalho)**


- Pé direito mínimo exigido: 3000mm
- Piso nivelado.....
- Óleo hidráulico: ISO VG 46 - Capacidade 6 Litros.....
- Ponto de energia: Monofásico 220v/60Hz com Disjuntor de 25A.....
- Fiação monofásica com aterramento e Ø 4 mm.....

Eu, , CPF/CNPJ . Confirmo que todas as exigências citadas acima para a instalação do elevador foram cumpridas e confirmadas com no mínimo **3 dias** de antecedência da data de entrega agendada. O não cumprimento dessas exigências, impede que a instalação seja realizada e que todos os custos operacionais sejam cobrados, assim como o valor da instalação de **R\$1000**, deslocamento (Base Mahovi - Sorocaba, SP) **R\$2,50** por KM, despesa com hotel, alimentação.

ASSINATURA

ENVIAR ESTE DOCUMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE VENDAS PARA QUE SEJA DADA SEQUÊNCIA AO PROCESSO DE VENDAS VIGENTES.

DIMENSÕES

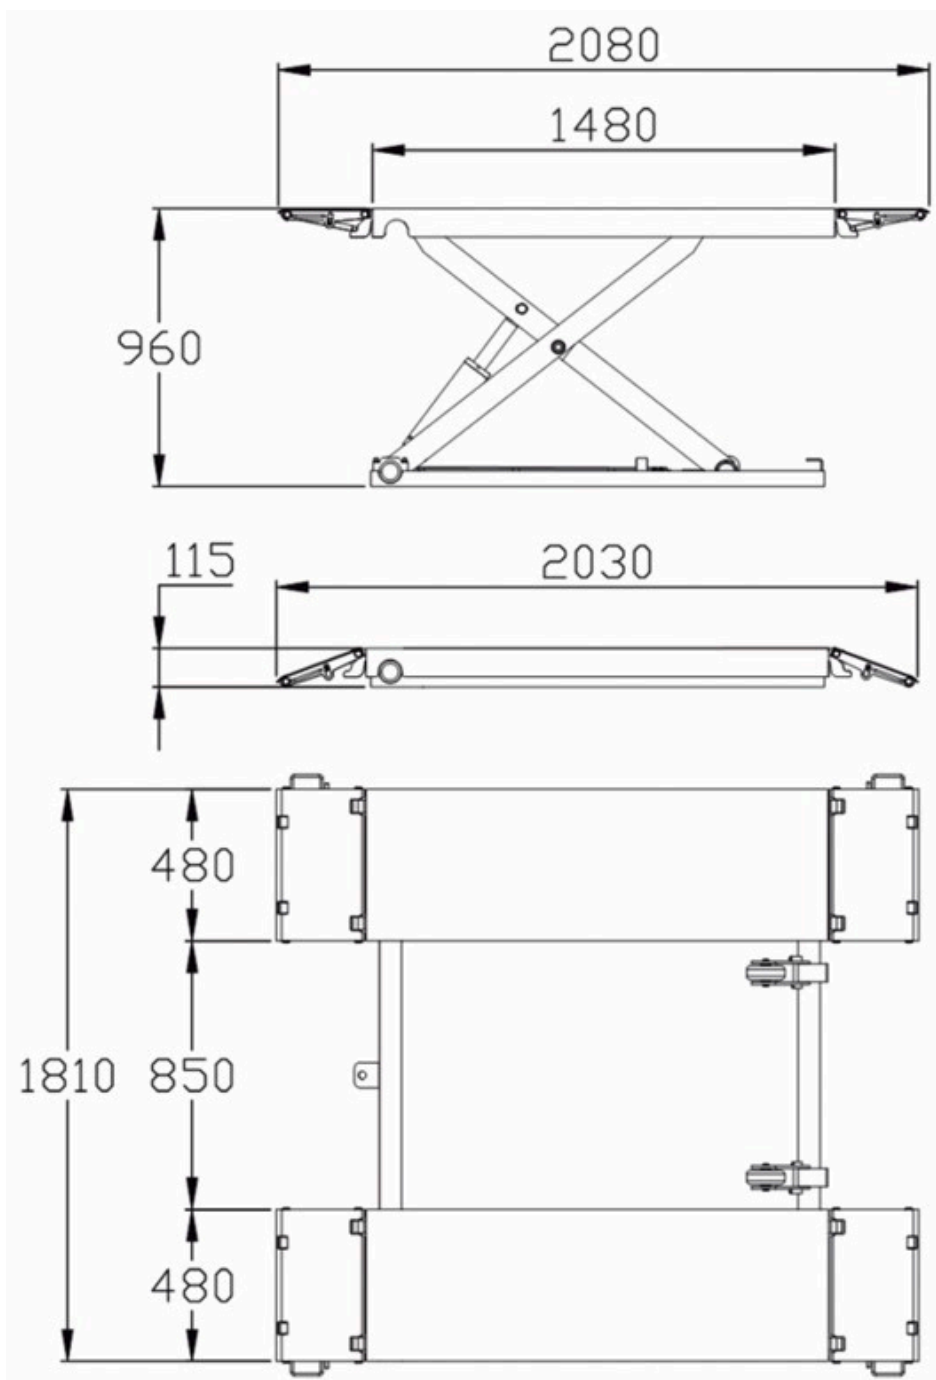

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tipo de máquina	Elevador tipo tesoura MAH-2004
Acionamento	Eletro hidráulico
Capacidade de elevação	3000kg
Altura da máquina de elevação	960mm
Altura inicial da plataforma	115mm
Comprimento da plataforma	1480mm
Largura da plataforma	480mm
Tempo de elevação	≤35s
Tempo de descida	≤35s
Comprimento total da máquina	2020mm
Largura total da máquina	1760mm
Alimentação de energia	Monofásico 220v
Potência total da máquina	2.2kw
Óleo hidráulico	6L corresponde ao óleo hidráulico "vestível"
Temperatura de trabalho	5-40°C
Umidade de trabalho	30-95%
Ruidosa	< 70db
Temperatura de Armazenamento	-25°C~55°C

Motor :

Tipo..... Y90L
 Pot. Máx..... 2.2kw
 Tensão Máx..... AC 220 ±5%
 Eletricidade Máx. 380V:2A
 220V:10A
 Frequência Máx..... 50Hz
 Polos..... 4
 Velocidade..... 2800rpm/min
 Formato de edifício B18
 Classe de Isolamento F
 Ao conectar o motor, consulte os diagramas incluídos e a direção do motor no sentido horário.


Bomba :

Tipo P4.3
 Modelo bomba de engrenagem
 Flux. Máx..... 1.2cc/r
 Tipo de junta..... Válvula de alívio da junta
 Pressão de trabalho conjunta..... 210bar
 Pressão de trabalho intermitente... 150 ~ 300 bar
 Injete 6 litros de óleo hidráulico vestível no tanque de óleo.

DIMENSÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Figura do equipamento básico

Figura 15 (A caixa de comando pode ser colocada à esquerda ou à direita)

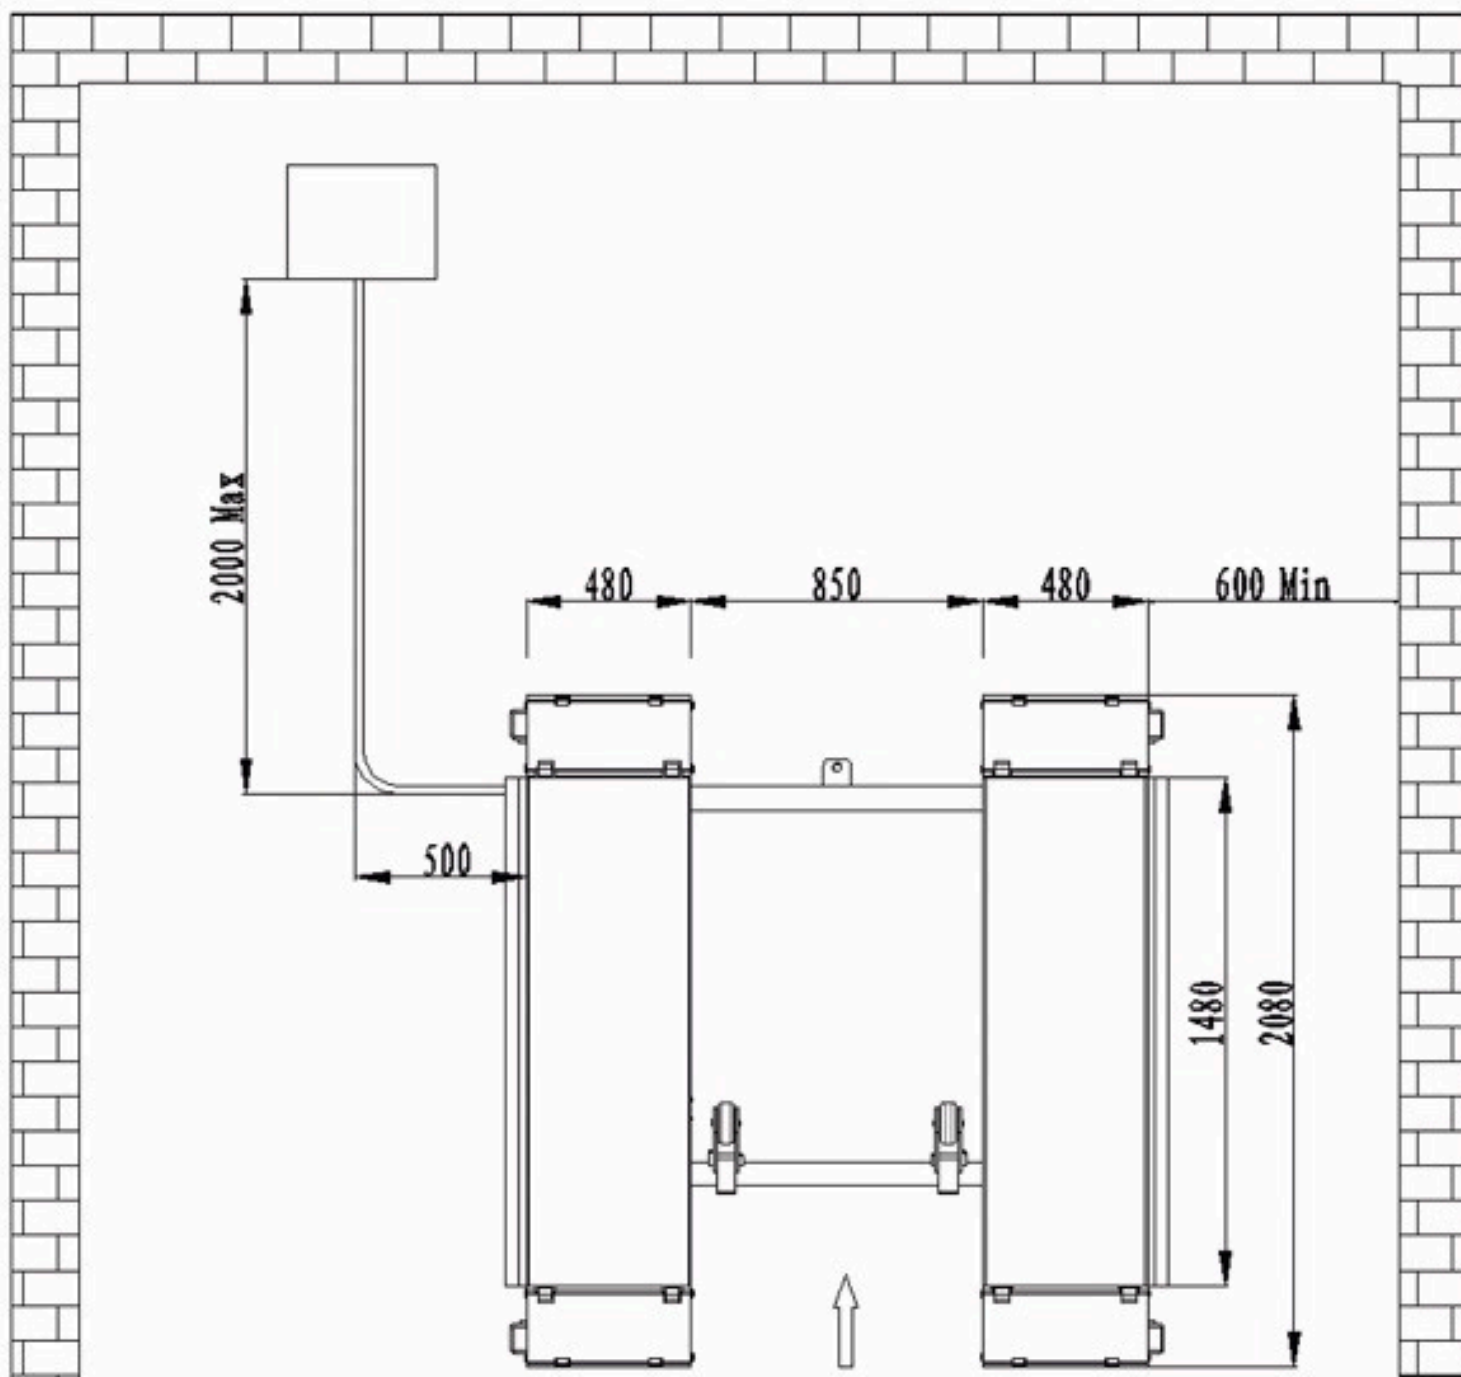



MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO
MAH-2004



WWW.MAHOVI.COM.BR



Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP
